

ドイツ・インフラサーブ・プロジェクト 進捗状況

荏原 (6361)

インフラサブPJ 進捗状況

1. 工事進捗状況

進捗率 98% (2010年10月20日時点)

2. 試運転状況

① RDF焼却運転の状況 (2010年10月20日時点)

	運転時間	処理量
Line-1	300時間	5,300ton
Line-2	400時間	6,800ton
Line-3	150時間	2,600ton
	合計	14,700ton

② 共通系の試運転の状況

タービン運転	2010/9/23	運転開始(定格3000rpm)
発電機運転	2010/10/7	発電開始

インフラサーブPJ 試運転状況



RDF受入棟

ボイラ棟

プラント外観

2011年3月期第2四半期決算説明会


インフラサーブP J 試運転状況



中央操作室

2011年3月期第2四半期決算説明会


インフラサブP J 試運転状況

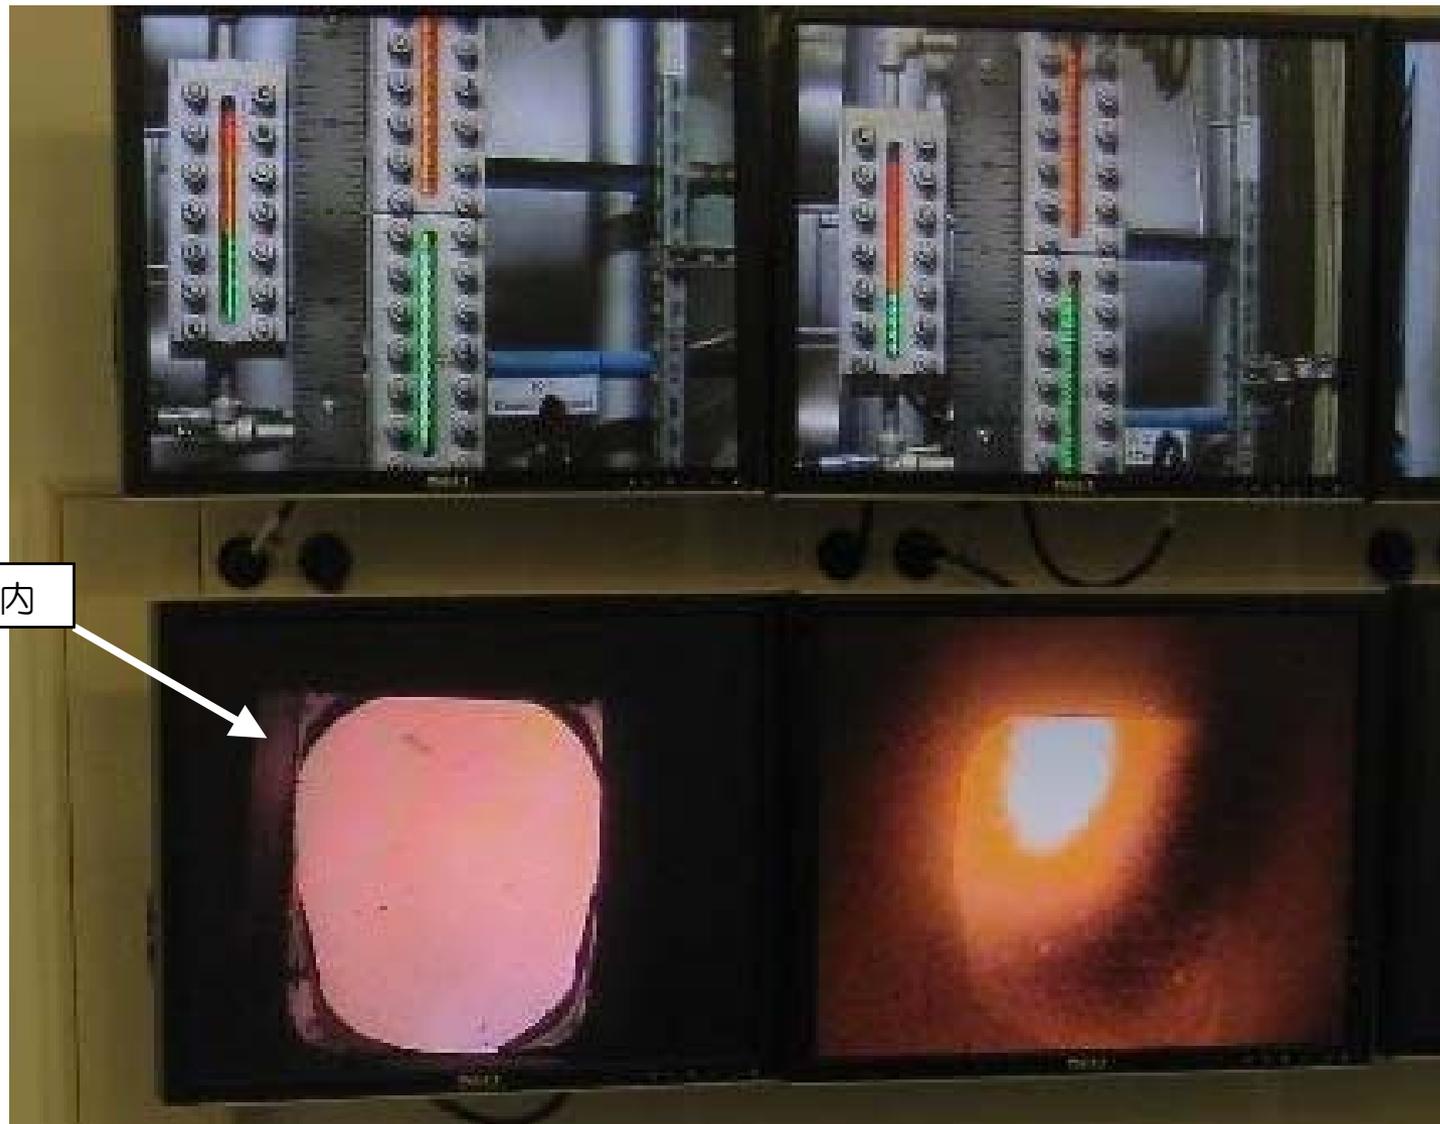

中央操作室運転監視モニタ

2011年3月期第2四半期決算説明会

インフラサーブPJ 試運転状況

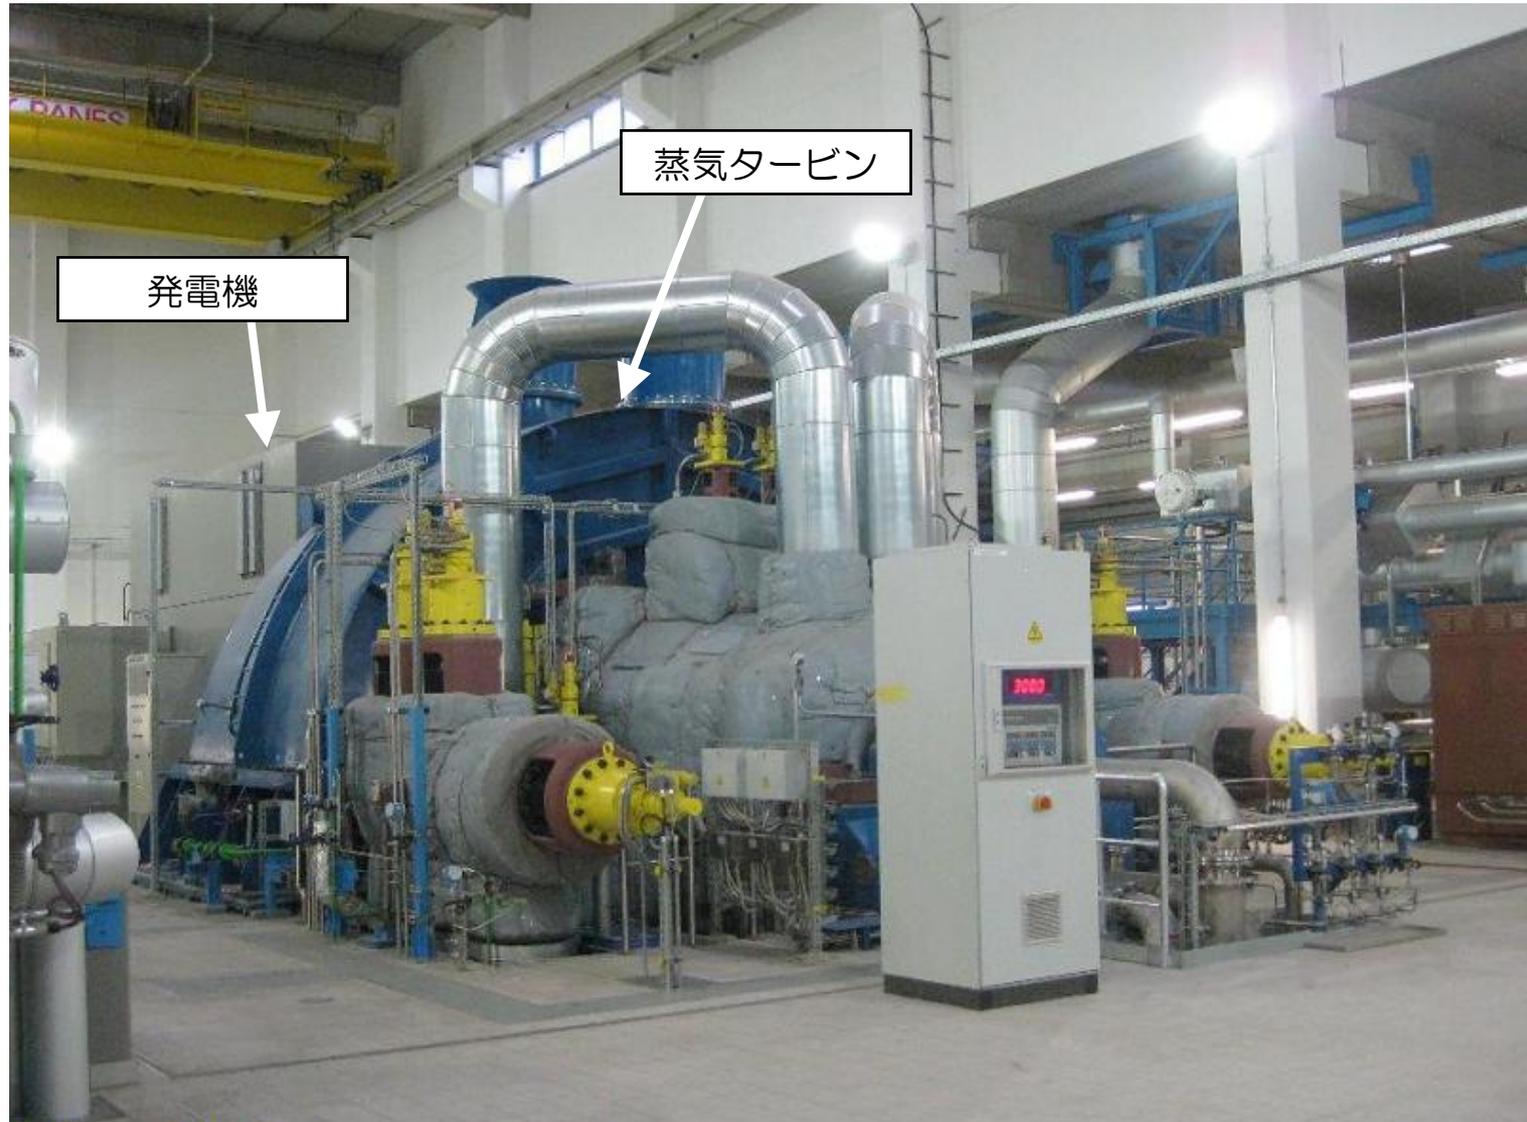

タービン発電機 (3000rpm運転中)

2011年3月期第2四半期決算説明会

インフラサーブPJ 進捗状況

今後のスケジュール（予定）

プラント竣工	2010年	12月
正式引渡し	2011年	5月

本資料に記載されている業績予想・計画ならびに将来予測は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および、将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定、を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
